



*Gobierno Autónomo Departamental de Oruro*

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2020

**EDSON MILTON OCZACHOQUE GERÓNIMO**  
**GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**


**Oruro, enero de 2021**



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL G.A.D. ORURO - 2020

## PRESUP. VIGENTE = 605,84 Millones de Bs.

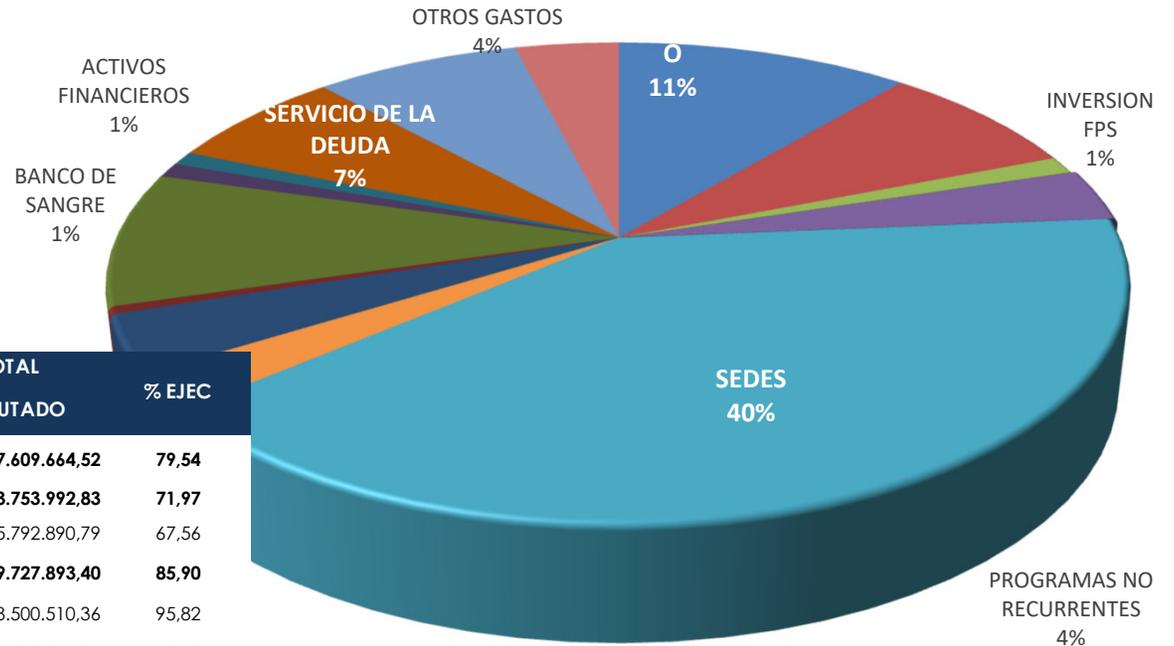


PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	TOTAL	% EJEC
	VIGENTE	EJECUTADO	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47.286.595,05</b>	<b>37.609.664,52</b>	<b>79,54</b>
<b>INVERSION</b>	<b>74.693.924,55</b>	<b>53.753.992,83</b>	<b>71,97</b>
INVERSION FPS	8.574.058,96	5.792.890,79	67,56
<b>PROGRAMAS NO RECURRENTE</b>	<b>22.966.386,12</b>	<b>19.727.893,40</b>	<b>85,90</b>
(2)ALDO	8.871.732,00	8.500.510,36	95,82
(3) SEDES	226.162.187,60	224.883.841,33	99,43
(4) SE.DE.GES	12.668.698,53	12.446.397,47	98,25
(5) SE.D.CAM.	21.495.732,00	12.722.617,46	59,19
(6) SE.DE.DE	3.320.177,03	2.729.123,99	82,20
(7) HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS	78.081.562,99	56.973.841,85	72,97
(8) BANCO DE SANGRE	5.661.610,23	3.895.269,33	68,80
(1) Grupo 5000 ACTIVOS FINANCIEROS	2.272.956,54	0,00	0,00
(1) Grupo 6000 SERVICIO DE LA DEUDA	44.518.600,16	30.833.306,64	69,26
(1) Grupo 7000 TRANSFERENCIAS	46.844.376,74	28.804.257,94	61,49
(1) Grupo 9000 OTROS GASTOS	11.299.078,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>605.845.945,00</b>	<b>490.173.097,55</b>	<b>80,91</b>



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL G.A.D. ORURO -2020

## PRESUP. TOTAL = 232,94 Millones de Bs.

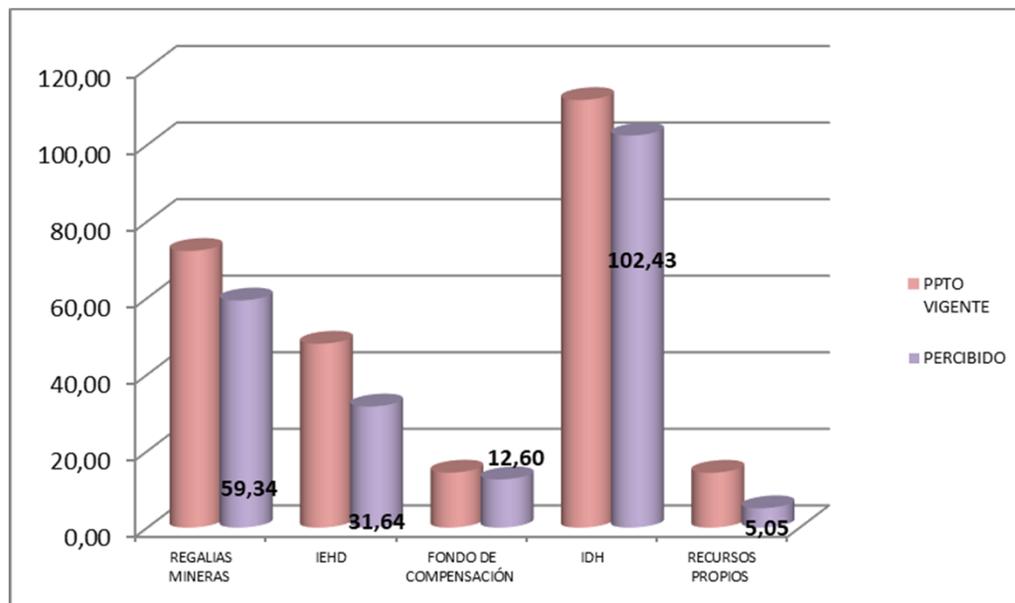


FUENTE Y ORG.	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	% EJEC
20-220	REGALIAS MINERAS	72,28	72,28	59,34	<b>82,10</b>
41-117	IEHD	48,03	48,03	31,64	<b>65,86</b>
41-116	FONDO DE COMPENSACIÓN	14,36	14,36	12,60	<b>87,75</b>
41-119	IDH	83,94	111,70	102,43	<b>91,70</b>
20-230	RECURSOS PROPIOS	14,33	14,33	5,05	<b>35,25</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>232,94</b>	<b>260,70</b>	<b>211,06</b>	<b>90,60</b>



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HISTÓRICA PERIODO: 2015 – 2020

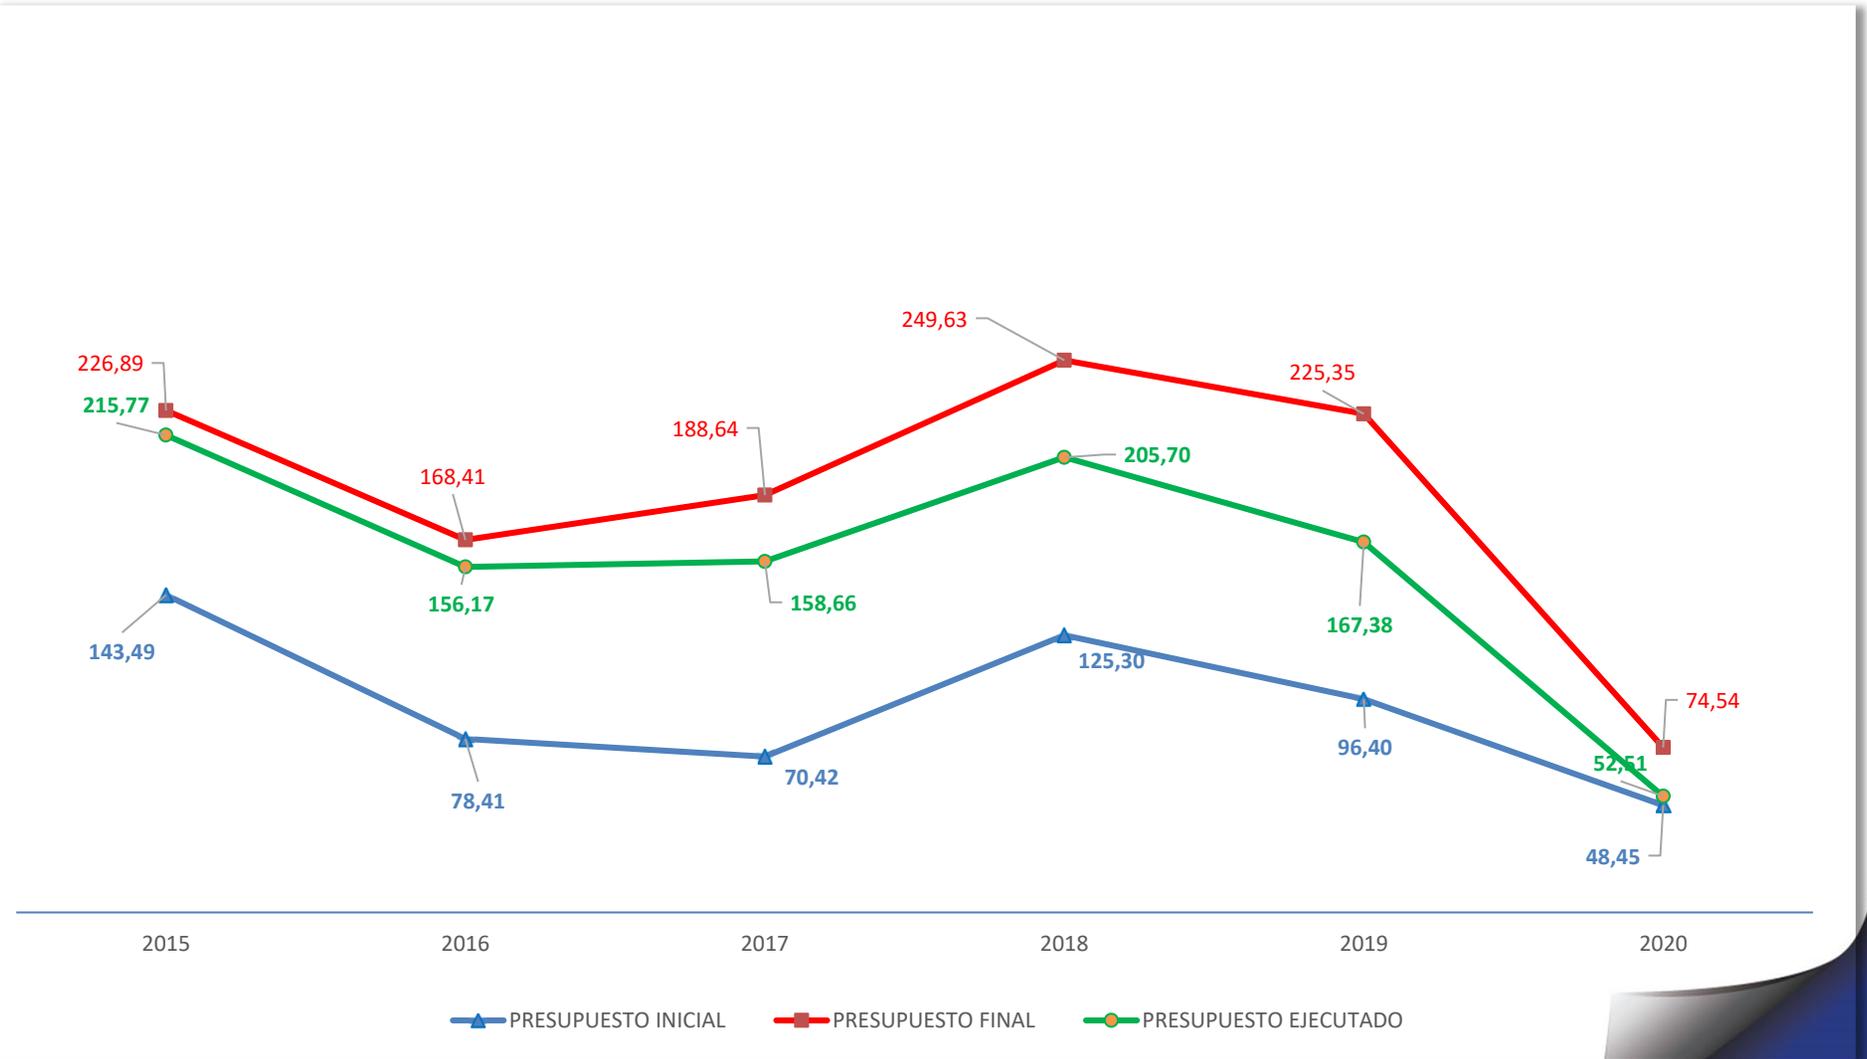


- El gráfico considera presupuesto del POA del GAD ORURO, con su CÓDIGO INSTITUCIONAL.

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍAS

### PERIODO: 2015 – 2020


**EJECUCION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

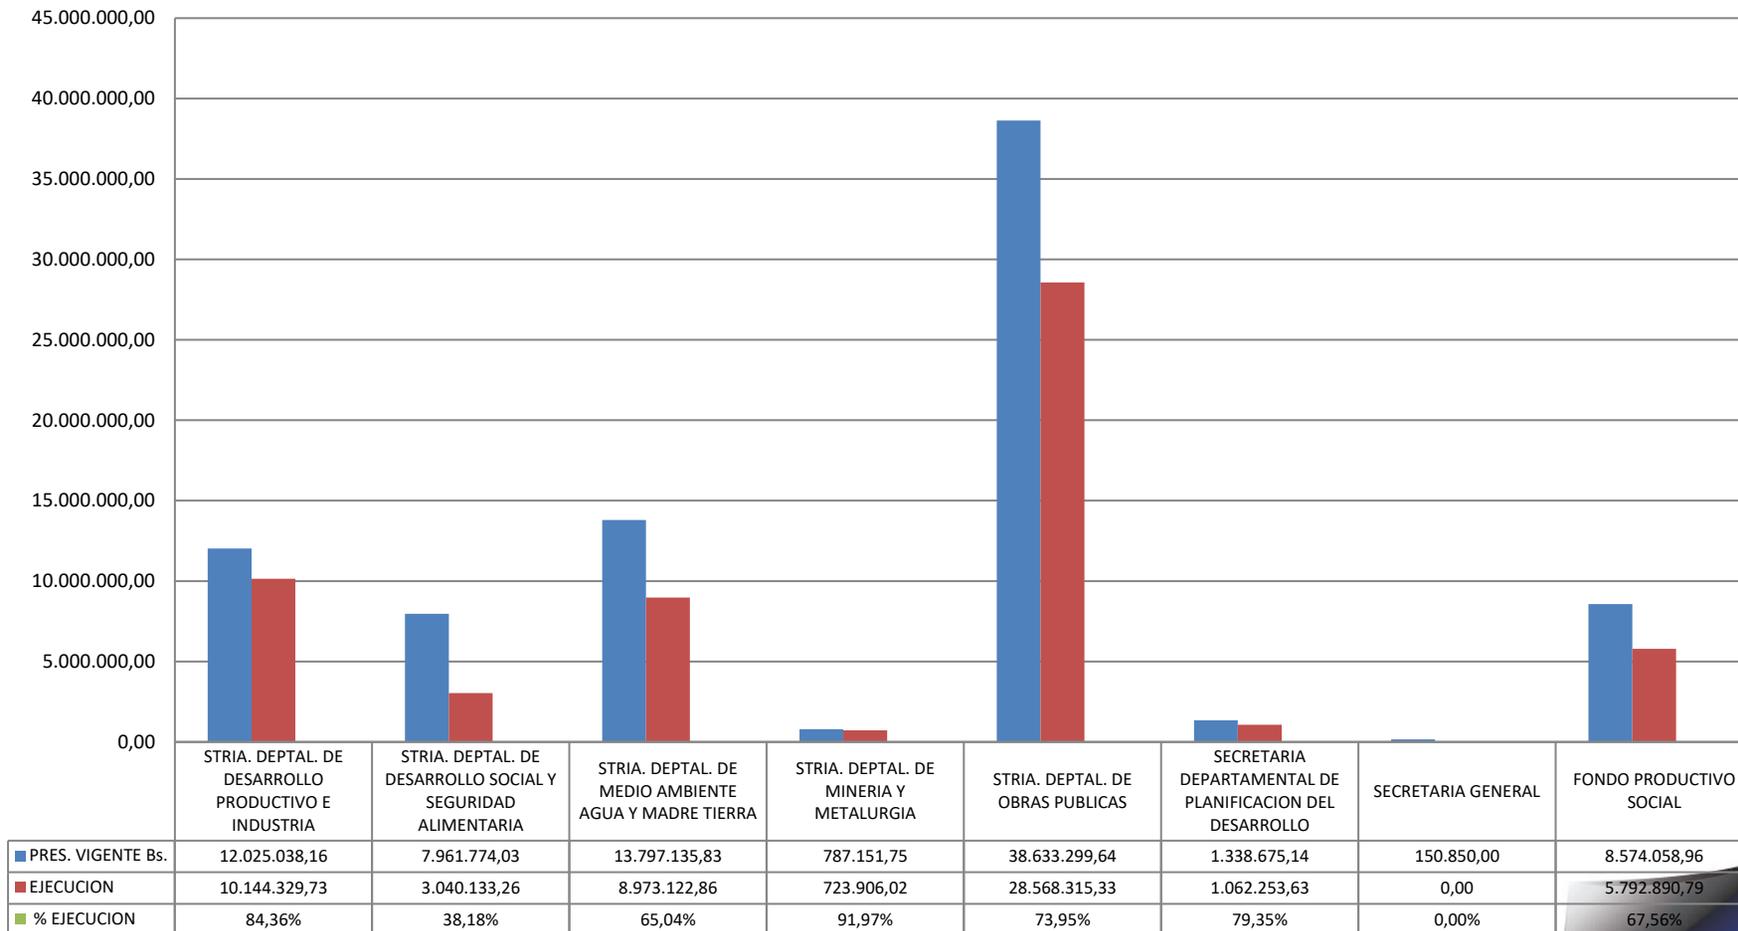

- El gráfico considera presupuesto del POA del GAD ORURO, con su CÓDIGO INSTITUCIONAL.

# DISTRIBUCIÓN DEL PRESUP. DE INVERSIÓN EN PROYECTOS

FASE	PROYECTOS	% DE PROYECTOS
PREINVERSIÓN	49	41,18%
EJECUCION	70	58,82%
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>100,00%</b>

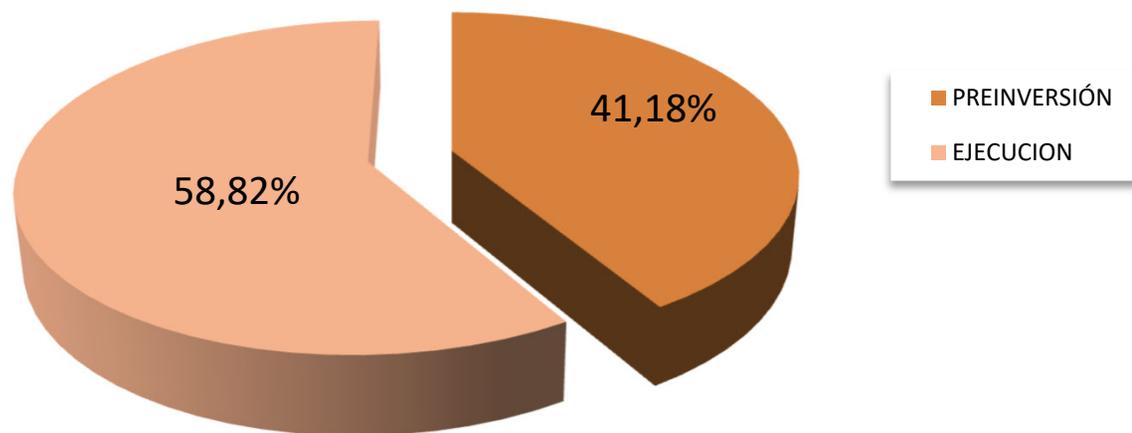


- INCLUYE PROYECTOS CON EL FPS.



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# CARRETERAS Y PUENTES GESTIÓN 2020

(Monto expresado en Millones de Bs.)

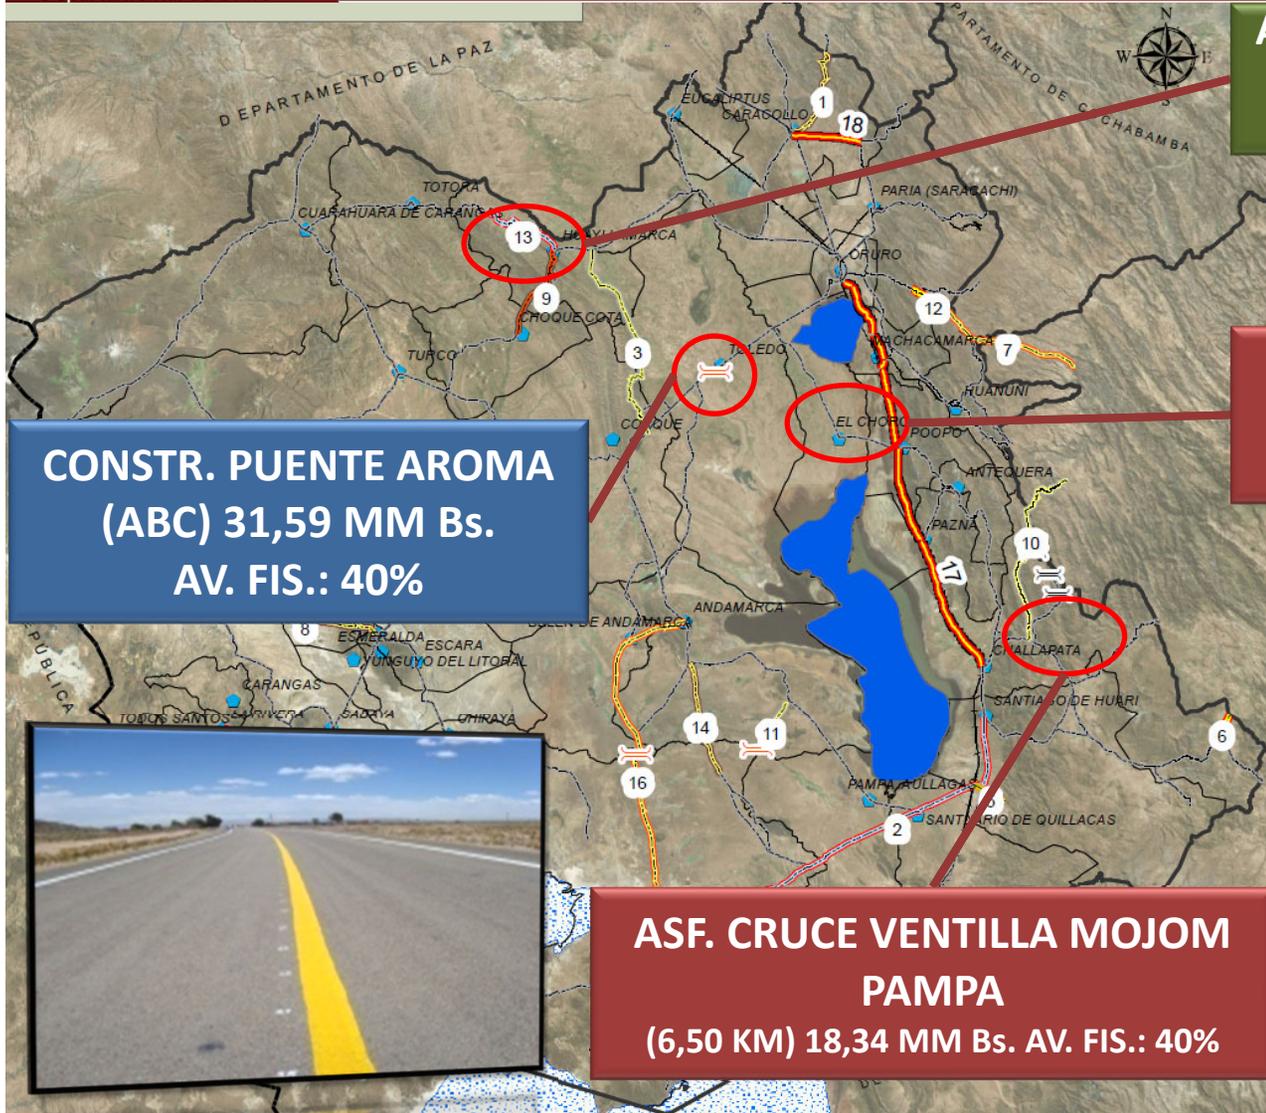

**ASF. TRAMO III CHUQUICHAMBI  
HUAYLLAMARCA (21,94 KM)**  
90,23 MM Bs. - AV. FIS.: 100%

**ASF. EL CHORO PTE. CARACILA  
(TRAMO I) (16,50 KM) 41,29 MM Bs.**  
AV. FIS.: 65%

**CONSTR. PUENTE AROMA  
(ABC) 31,59 MM Bs.**  
AV. FIS.: 40%

**ASF. CRUCE VENTILLA MOJOM  
PAMPA**  
(6,50 KM) 18,34 MM Bs. AV. FIS.: 40%

**Leyenda**

- CONST. PUENTE (INV.)
- CONST. PUENTE (PRE INV.)

**Leyenda**

- CAMINO ASFALTADO (INV.)
- CAMINO ASFALTADO (PRE INV.)
- CAMINO RIPIO (INV.)
- CAMINO RIPIO (PRE INV.)
- MEJ. CAMINO ASFALTADO (INV.)
- MEJ. CAMINO ASFALTADO (PRE INV.)
- MEJ. CAMINO RIPIO (PRE INV.)
- RED DE CAMINOS

En gestión de financiamiento: **Asf. Oruro – La Joya Chuquichambi Totorá Curahura de Carangas RF0031:**  
Tramo II: La Joya – Chuquichambi - Tramo IV: Huayllamarca Totorá





Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## CONST. UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FAJARDO MUNICIPIO OROURO

COSTO Bs.	4,969,122,30
AVANCE FÍSICO	En proceso de inicio
ÁREA CONSTRUIDA	869,64

## CONST. UNIDAD EDUCATIVA MINEROS 2000

COSTO Bs.	5.057.667,35
AVANCE FÍSICO	100%
ÁREA CONSTRUIDA	2.659,41



## CONST. UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA F-II

COSTO Bs.	4.969.122,30
AVANCE FÍSICO	100%
ÁREA CONSTRUIDA	869,64

## CONST. UNIDAD EDUCATIVA AYACUCHO MUNICIPIO OROURO


COSTO Bs.	4,969,122,30
AVANCE FÍSICO	En proceso de inicio
ÁREA CONSTRUIDA	869,64





Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PROYECTOS ELECTRIFICACIÓN RURAL (U.E.H.– S.D.O.P.)

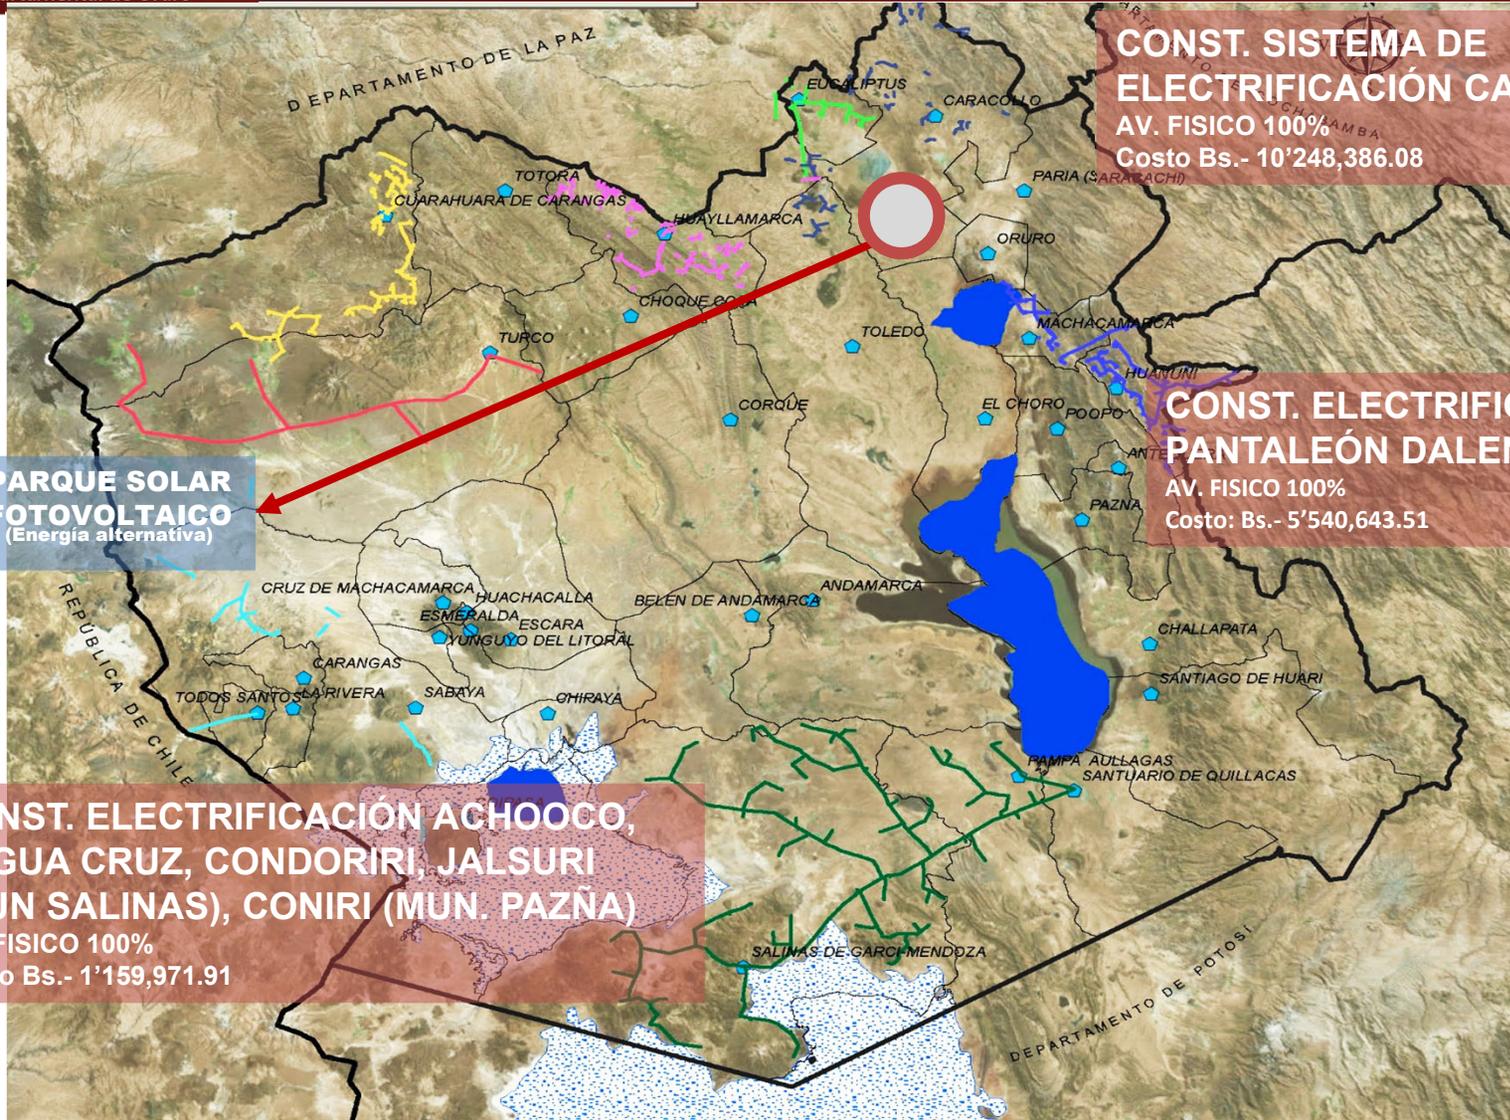

**CONST. SISTEMA DE  
ELECTRIFICACIÓN CARACOLLO**  
AV. FISICO 100%  
Costo Bs.- 10'248,386.08

**PARQUE SOLAR  
FOTOVOLTAICO**  
(Energía alternativa)


**CONST. ELECTRIFICACIÓN PROV.  
PANTALEÓN DALENCE FASE II**  
AV. FISICO 100%  
Costo: Bs.- 5'540,643.51

**CONST. ELECTRIFICACIÓN ACHOOCO,  
LAGUA CRUZ, CONDORIRI, JALSURI  
(MUN SALINAS), CONIRI (MUN. PAZÑA)**  
AV. FISICO 100%  
Costo Bs.- 1'159,971.91



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# ALCANTARILLADO DE BARRIOS PERIURBANOS FASES II – III – IV EMBOVEDADO TAGATERE Fase I

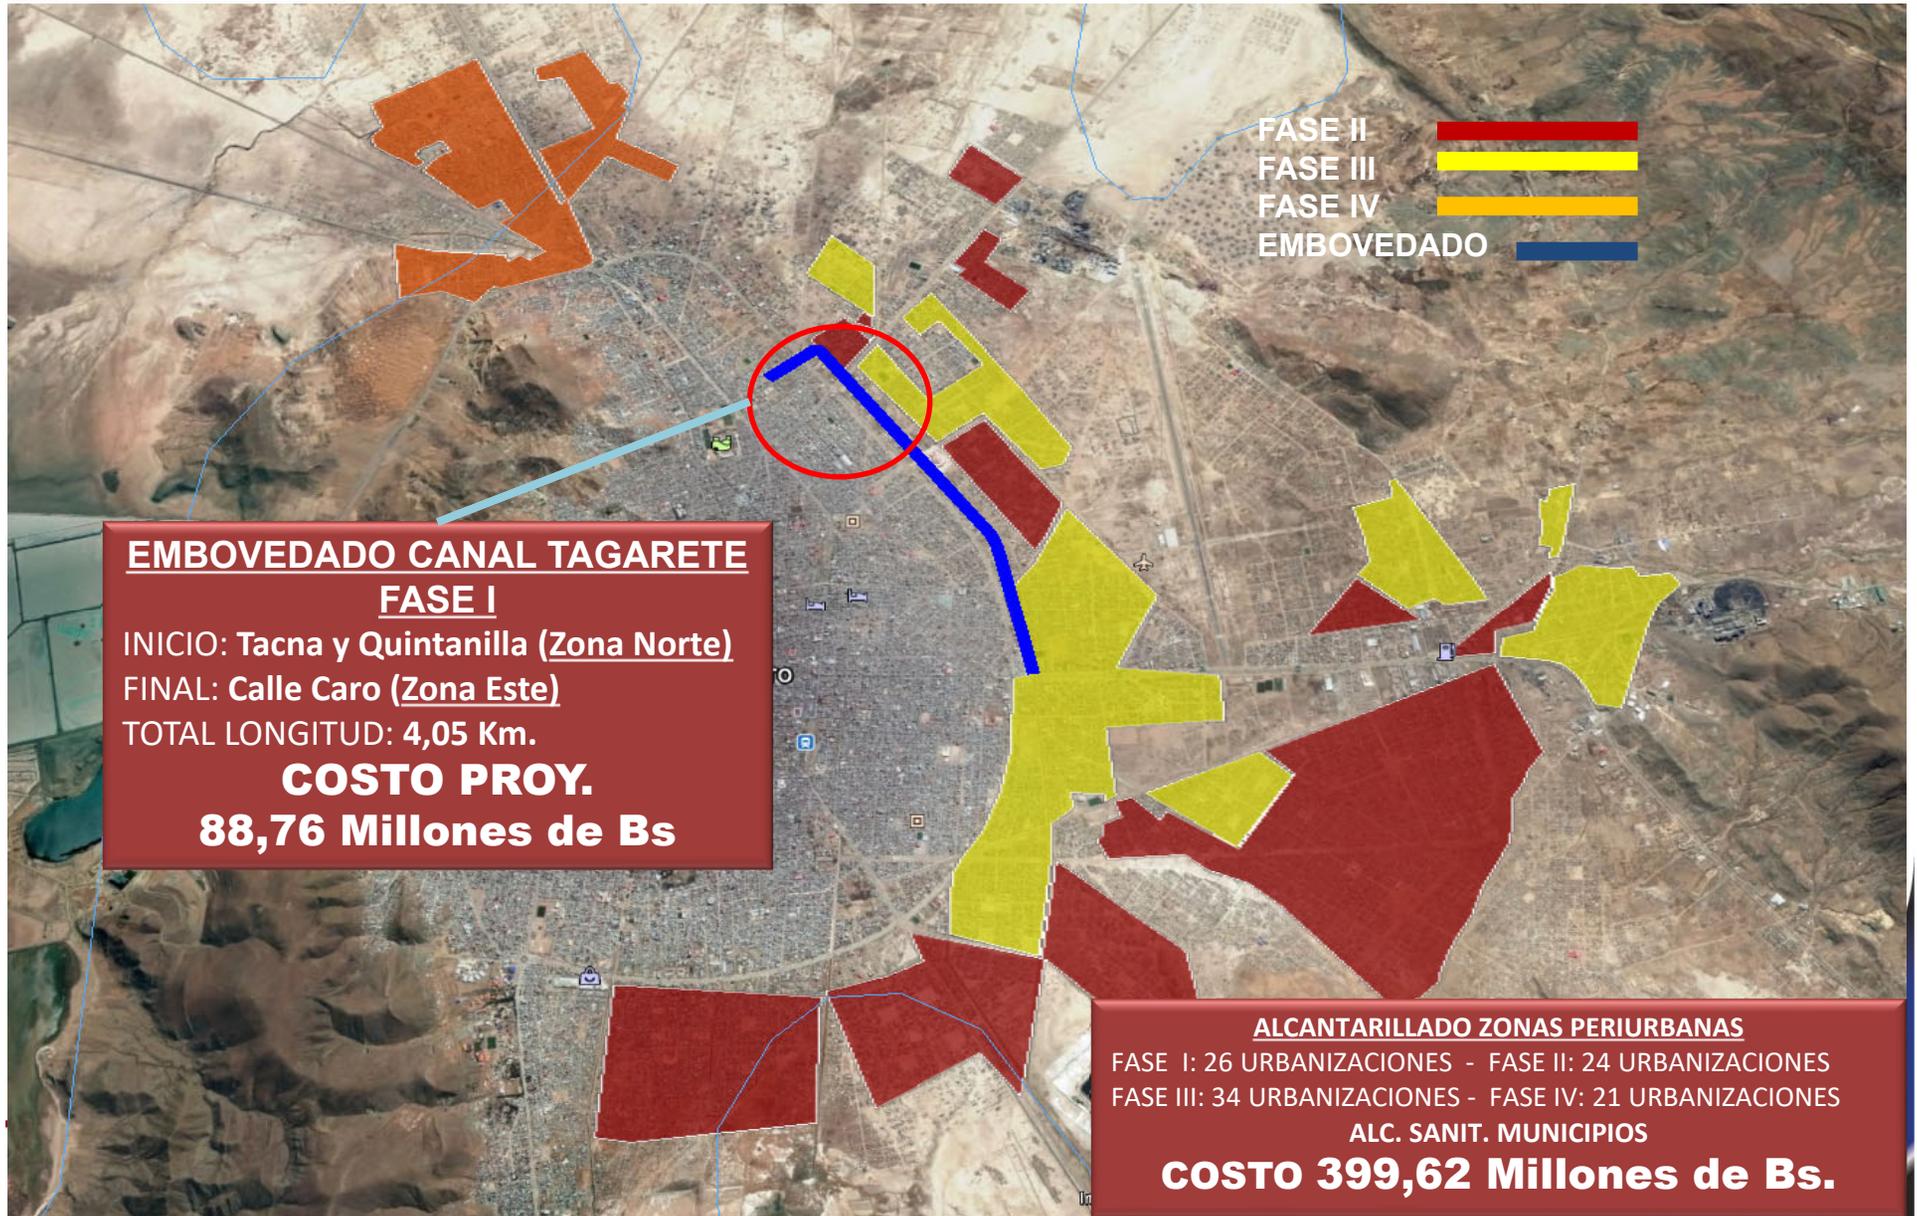




Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DEPARTAMENTO DE ORURO

**PRESA SIST. RIEGO  
SAN MIGUEL  
(CONCLUIDO)**

**CONSTR. PRESA  
HUAYLLAPAMPA  
AV. FISICO: 75%**

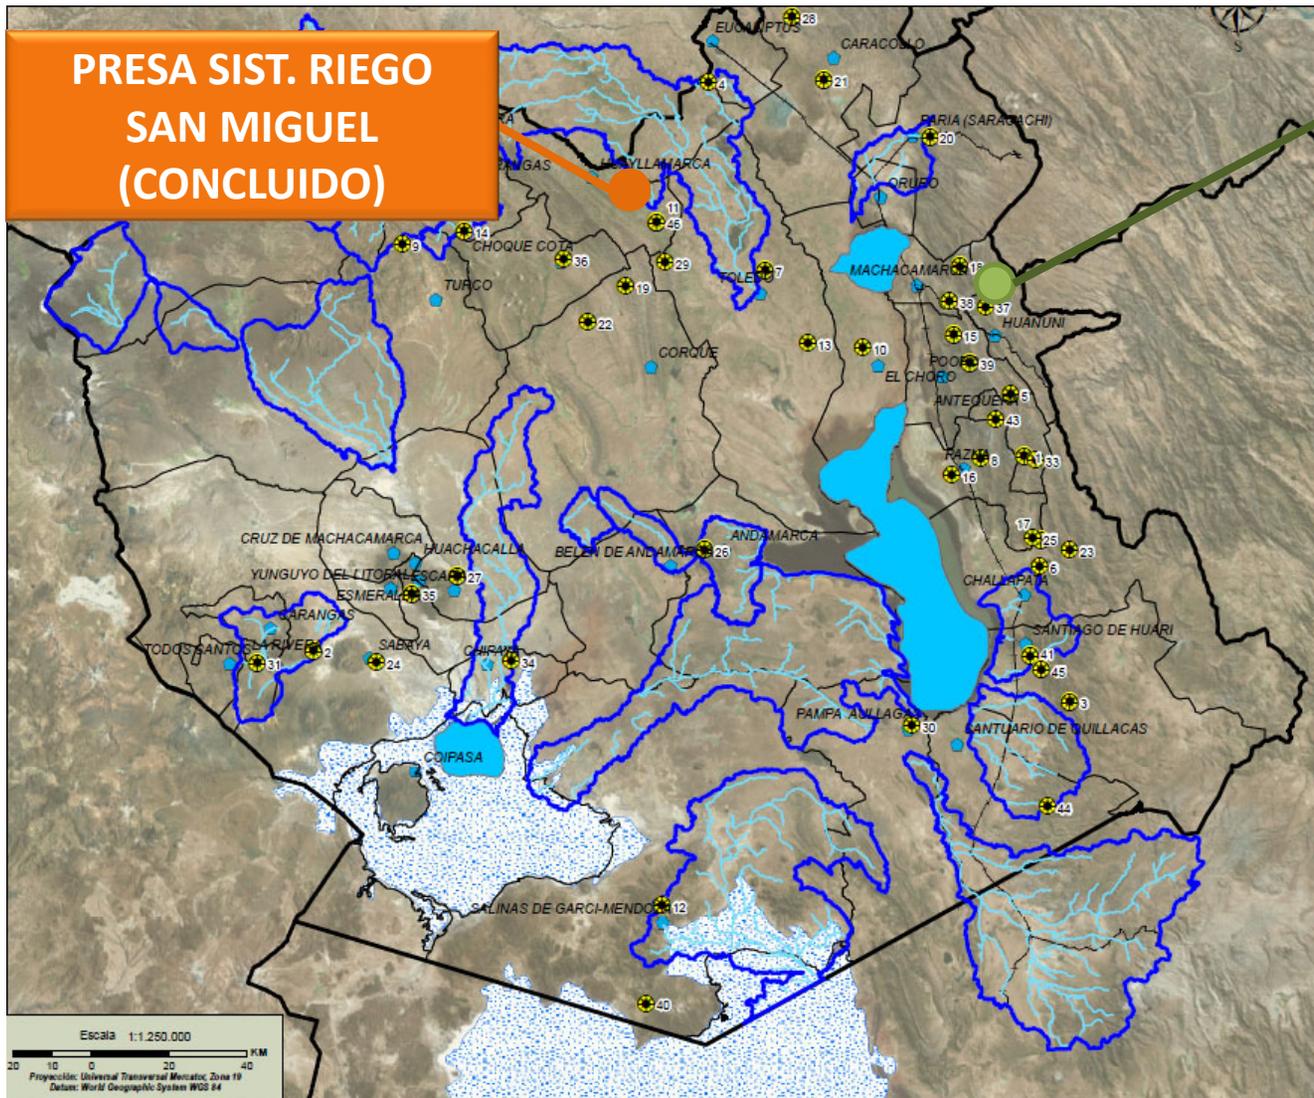



# RESUMEN DE INVERSIONES (MIC – PRESAS – RIEGOS)

## MONTOS POR TIPO DE PROYECTO

195.472.779,12 Bs

74 Proyectos de preinversión e Inversión

TÍTULO DEL EJE



	MIC 1735,45 Km2 intervenidos con MIC	PRESA 475029,1 m3 de agua embalsada y regulado	RIEGO 1372,71 Ha. Con riego incremental
▾ Monto de inversión (Bs)	55.130.673,06	33.736.473,22	106.605.632,84
▾ Familias beneficiarias	2.210,00	358,00	1.726,00
▾ Área Incremental (Ha)	0,00	245,00	1.372,71
▾ Nro Proyectos	36	2	36


- Total Beneficiarios 4.294 Familias
- 475.029,10 m3 de agua embalsada y regulada

Sup. con MIC 1.735,45 Km2  
Área Incremental 1.617,71 Ha



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PROYECTOS RECURSOS HIDRICOS MEDIO AMBIENTE

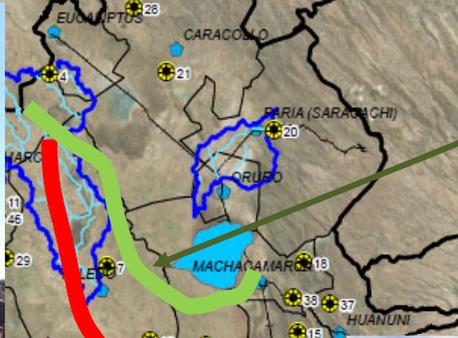

## CONSTR. DIQUES DE PROTECCIÓN BRAZO IZQUIERDO RIO DESAGUADERO

INVERSIÓN: 19,76 Millones de Bs.  
PRESUPUESTO 2020: 2,38 Millones de Bs.  
Avance Físico 50,97%



## IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO DESAGUADERO DEPTO. DE ORURO

INVERSIÓN: 45,57 Millones de Bs.  
Av. Físico 5,20%





Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCION DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS

## METAS ALCANZADAS Y ACCIONES DESARROLLADAS :

N°	DETERMINACION DE LAS OPERACIONES (1)	METAS
1	Trabajos de atención a Emergencias por época de lluvias (conformación de diques de protección y dragado de los ríos).	10 atenciones a emergencias
2	Trabajos de atención a demandas comunales (trabajos de dragado, canalización, rehabilitación de canales de riego, traslado de material de ripio para remediación de tramos afectados por las inundaciones, trabajos de excavación y limpieza de vigiñas, traslado de agua en época seca).	40 atenciones a demandas comunales
3	Inspecciones técnicas realizadas de acuerdo a solicitudes (demandas comunales).	60 inspecciones
4	Convenios intergubernamentales suscritos entre el GADOR y GAM's (Macros e individuales).	10 convenios
5	Excavación nueva y limpieza de vigiñas (m3).	3.220,87 m3
6	Elaboración de perfiles de proyectos de prevención y mitigación ante eventos climáticos.	3 perfiles





# HOSPITAL DE TERCER NIVEL (FASE I) ORURO – COREA ATENCIÓN EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

**Proyecto. Centro de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria COVID-19 Campo Ferial Oruro y, Obras complementarias Hospital General San Juan de Dios de Oruro:**

**BLOQUE 1. Obras Complementarias Hospital General San Juan de Dios de Oruro y Bloque Oruro Corea.** Implementación del Laboratorio de Biología Molecular del COVID-19 en el departamento de Oruro. Ampliación de consulta externa 12 consultorios.

Unidad de Terapia Intensiva COVID-19 Hospital General S.J.D.D.O. con 21 camas UTI.

**BLOQUE 2. Centro de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria COVID-19 Campo Ferial Oruro.**

**Componentes:** Unidad Hospitalaria Móvil COVID-19 (2 Unidades); 8 camas/unidad = T. 16 camas; Módulo de Atención Medica TRIAGE. (Laboratorio farmacia e Insumos); Módulo de Internación. Unidad de Aislamiento; capacidad de 100 camas, proyección a 400 camas. Unidad de Terapia Intermedia; programado para 40 camas de Internación.

**PRESUPUESTO.-** Total referencial 27,7 Millones de Bs

16,5 Millones de Bs. recursos propios del G.A.D. ORURO

11,2 Millones de Bs. Ley 1307.

## ACCIONES IMPLEMENTADAS CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO

El Ministerio de Salud entregó 200 ítems, de los cuales 56 ítems eran acéfalos de la gestión 2019 que se doto al H.G.S.J.D.O. con él SUS, siendo los ítems de nueva creación solamente 144 ítems:

DETALLE	Cantidad
<b>Medicos</b>	<b>50</b>
<b>Lic. Enfermeria</b>	<b>35</b>
<b>Odotologos</b>	<b>7</b>
<b>Bioquimicos Farmaceuticos</b>	<b>12</b>
<b>Auxiliares de Enfermeria</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>

### INDICADORES DE MONITOREO PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 DEPARTAMENTO DE ORURO


Descripción	Num.	Denominador	Constante	Indicador
<b>Población</b>		<b>551.116</b>		
<b>Tasa de Incidencia</b>	<b>4960</b>	<b>551.116</b>	<b>100.000</b>	<b>899 por 100.000 Hab.</b>
<b>Tasa de recuperacion</b>	<b>1923</b>	<b>4960</b>	<b>100</b>	<b>38,7 %</b>
<b>Tasa de Letalidad</b>	<b>256</b>	<b>4960</b>		<b>5,2 %</b>



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL – FASE II

## AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL ORURO

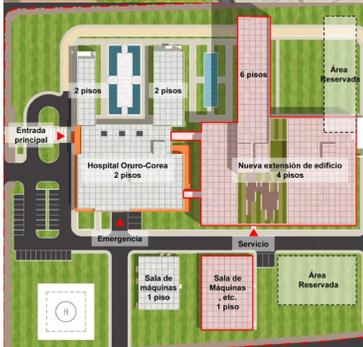

## AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO

**COSTO DE INVERSIÓN: 105 Millones de \$us. (ESTUDIO CONCLUIDO Y ENTREGADO PARA FINANCIAMIENTO)**  
**EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO, ANTE EL EXIMBANK DE COREA**



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTO DE ORURO


**CONSTR. PLATAFORMA  
LOGÍSTICA PUERTO SECO  
FASE II**

**CONSTR. PARQUE  
INDUSTRIAL DEPTO. DE  
ORURO**

**AMPL. Y EQUIPAMIENTO  
HOSPITAL DE TERCER NIVEL  
ORURO**

**CONSTR. AV. 2da.  
CIRCUNVALACIÓN  
CIUDAD DE ORURO**

**(EDTP) CONSTR. SISTEMA  
DE ALCANTARILLADO Y  
PLUVIAL, CASCO VIEJO DE  
LA CIUDAD DE ORURO**

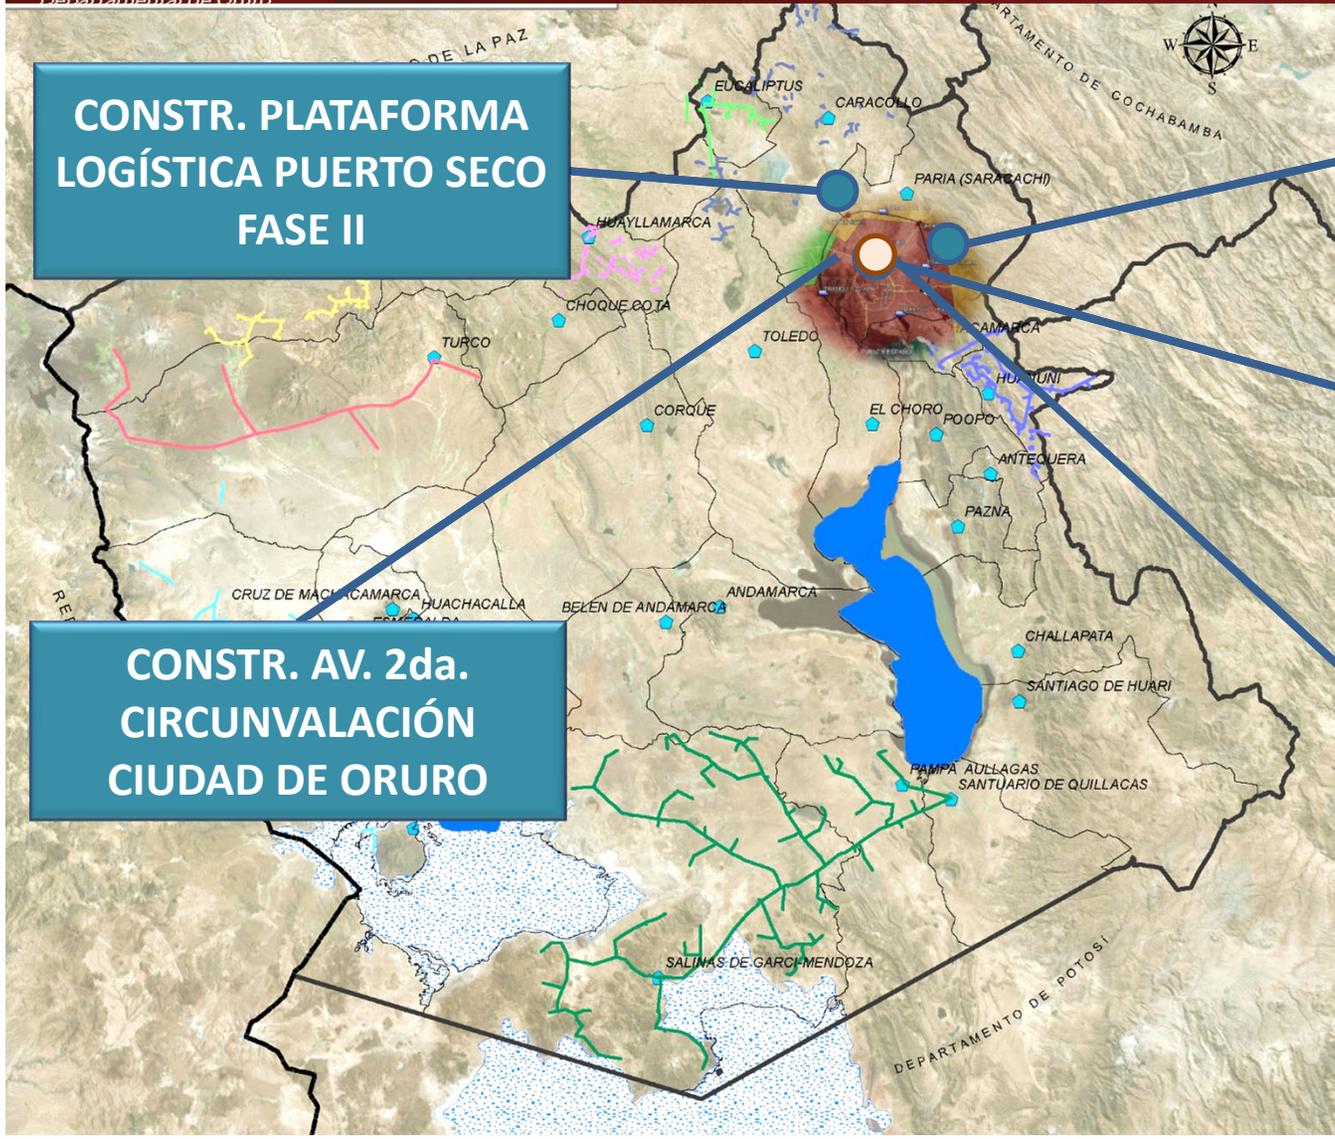



Gobierno Autónomo  
Departamental de Oruro

# SECTOR MINERIA

<b>EDTP – CONSTRUCCIÓN PLANTA DE LIXIVIACIÓN Y ELECTROLISIS DE PLATA</b>	<b>507.200</b>
--	----------------


Industrializar el mineral de plata que en la actualidad se exporta como concentrados mineralógicos

<b>CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA</b>	<b>3.821.042</b>
--	------------------

Capacitación y asistencia técnica a los operadores mineros de Cooperativas, empresas estatales y privada.

<b>EDTP - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE HIDRÓXIDO DE SODIO DEPTO. DE ORURO</b>	<b>910.000</b>
---	----------------

Proceso de industrialización del Sal (NaCl) y obtener el hidróxido de sodio, gas hidrogeno, gas cloro y otros derivados,

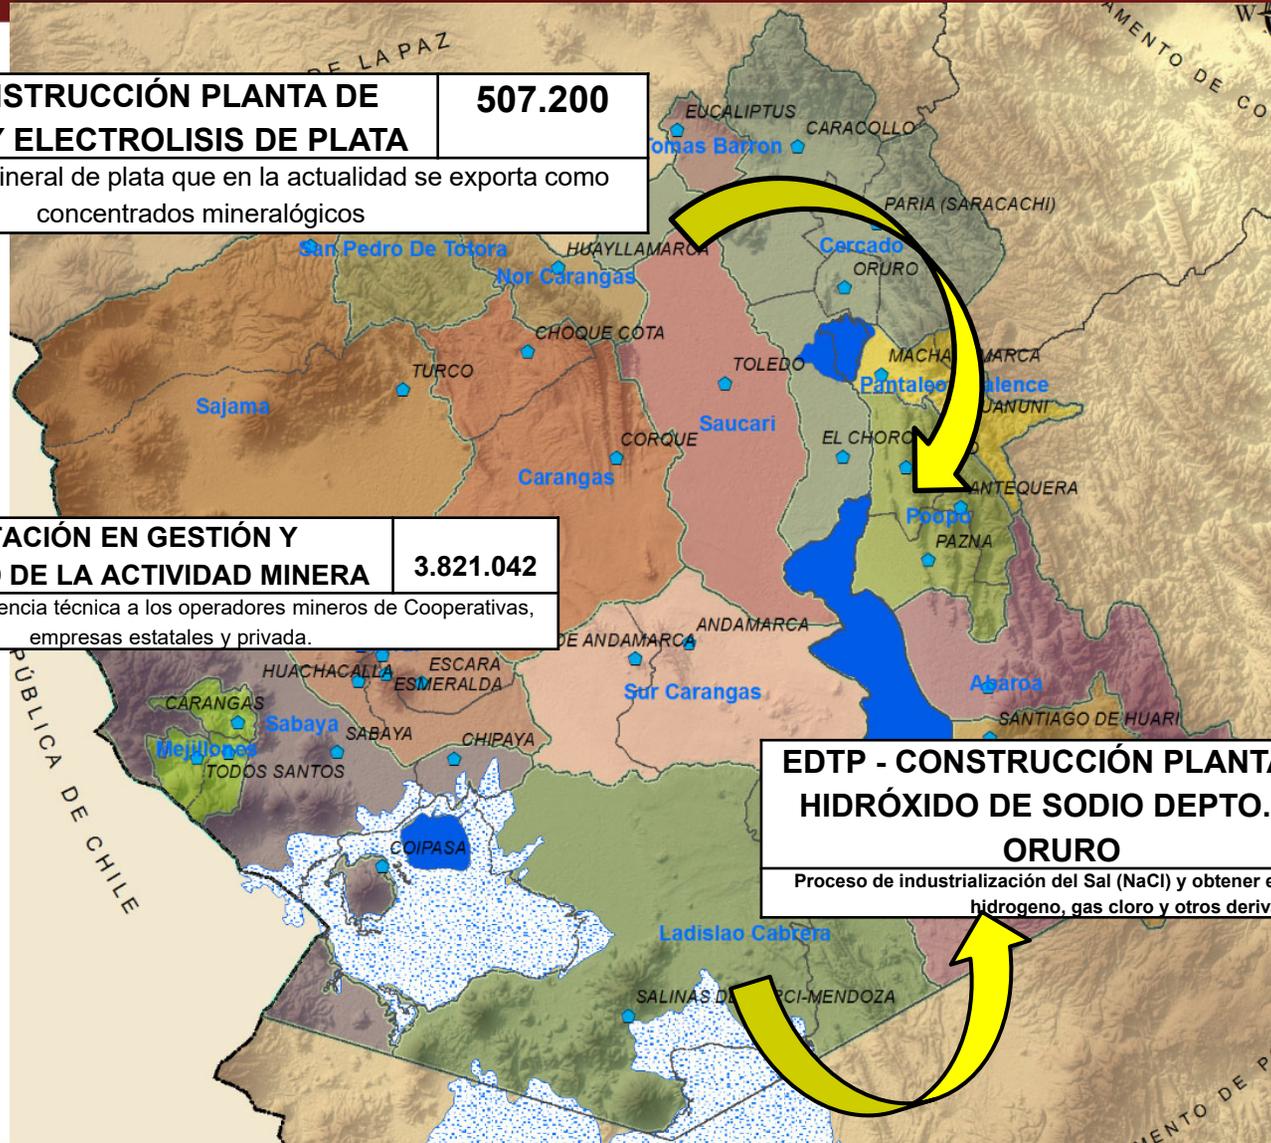



**GRACIAS**
